

**КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»**

Волгоградская ул., д.141, г. Ахтубинск, Астраханская область, 416500 Тел./факс (8-85141) 4-04-24 /, (8-85141) 4-04-15
ОКПО 78317643, ОГРН 1063022000282, ИНН/КПП 3001040259/300101001

АКТ № 10

**по результатам проведения контрольного мероприятия по теме:
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета,
выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в отношении МО «Успенский сельсовет»**

г. Ахтубинск

25 декабря 2019г.

На основании пункта 4.8 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год, распоряжением от 02.12.2019 №20-р «О проведении контрольного мероприятия» ведущим инспектором Украинской Юлией Викторовной проведено контрольное мероприятие в отношении муниципального образования «Успенский сельсовет» (далее - МО «Успенский сельсовет»).

Цель проверки: определение законности и результативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018-2019гг.

Юридический адрес объекта проверки: 416520, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка, ул. Микрорайон, д. 12.

Руководитель: глава МО «Успенский сельсовет» Мершиева Ольга Викторовна.

Проверяемый период деятельности: 2018 г. – истекший период 2019 г.

Срок проведения проверки: с 05.12.2019 г. по 25.12.2019 г.

Метод проверки: выездная проверка.

1. Нормативные документы, использованные в работе:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- Приказ Минфина России от 08.06.2018 №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- Постановление Правительства РФ от 30.01.2017г. №101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;
- Постановление Администрации МО «Ахтубинский район» №276 от 23.05.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;
- Постановление Администрации МО «Успенский сельсовет» №14-1 от 29.03.2017г. «О создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Успенский сельсовет»;
- Постановление Администрации МО «Успенский сельсовет» №82 от 21.12.2017г. (с изменениями от 26.03.2018г. №19, от 09.04.2018г. №23) «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» на 2018-2022 год»;

По результатам проверки, установлено следующее:

2. Утверждение и финансовое обеспечение муниципальной программы

Решением Совета МО «Успенский сельсовет» от 21.12.2017г. №26 «О бюджете МО «Успенский сельсовет» на 2018 год» денежные средства на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» на 2018-2022 гг.» на 2018 год не утверждены.

При уточнении бюджета МО «Успенский сельсовет» на 2018 год денежные средства на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» на 2018-2022 гг.» утверждены Решением Совета МО «Успенский сельсовет» от 30.03.2018г. №7 в размере 1395,5682 тыс. рублей.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в соответствии с Положением об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Успенский сельсовет», утвержденным Постановлением Администрации МО «Успенский сельсовет» №14-1 от 29.03.2017г. На заседании общественной комиссии по развитию городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» принято решение рекомендовать Администрации МО «Успенский сельсовет» утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» в 2018-2022 годы» (протокол заседания №4 от 31.10.2017г.)

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенского сельсовета» на 2018-2022гг.» утверждена Постановлением администрации «Успенского сельсовета» №82 от 21.12.2017г. Изменения в программу вносились Постановлениями администрации «Успенского сельсовета» №19 от 26.03.2018г., №23 от 09.04.2018г.

Решением Совета МО «Ахтубинский район «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 14.12.2017г. №396 (в редакции от 28.12.2017 №405, от 15.02.2018 №415, от 29.03.2018 №435, от 15.05.2018 №441, от 01.06.2018 №452, от 13.06.2018 №455, от 19.07.2018 №464, от 20.09.2018 №476, от 13.12.2018 №507, от 27.12.2018 №508) утверждено:

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе бюджету МО «Успенский сельсовет» в размере 1 182,68491 тыс. руб.;

Акт проверки №6 от 25.12.2019г.

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение выполнения условий порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017г. №276 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в том числе бюджету МО «Успенский сельсовет» в размере 212,88329 тыс. руб.

В соответствии с перечнем мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенского сельсовета» на 2018-2022гг.» между МО «Ахтубинский район» и МО «Успенский сельсовет» заключены:

- Соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды по кодам классификации расходов бюджетов РФ: код главного распорядителя средств бюджета МО «Ахтубинский район» 300, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 26100L5550, вид расходов 540, от 20.06.2018г. №120/18 (далее - Соглашение от 20.06.2018г. №120/18), а также Дополнительное соглашение от 25.07.2018г. №140/18 к Соглашению от 20.06.2018г. №120/18. В рамках данного Соглашения общий размер иного межбюджетного трансферта в 2018 году составляет 1 182,68491 тыс. рублей;

- Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Успенский сельсовет» на обеспечение выполнения условий порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017г. №276 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» от 25.07.2018г. №143 (далее - Соглашение от 25.07.2018г. №143). В рамках данного Соглашения общий размер иного межбюджетного трансферта в 2018 году составляет 212,88329 тыс. руб.

Показатели объема финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы соответствуют объему расходов на финансирование муниципальной программы, утвержденному Решением Совета от 21.12.2017г. №28 «О бюджете МО «Успенский сельсовет» на 2018 год» (в редакции от 26.02.2018г. №5, от 30.03.2018г. №7, от 29.06.2018г. №14, от 27.09.2018г. №21, от 27.12.2018г. №28).

3. Краткая характеристика муниципальной программы

В 2018 году на территории МО «Успенский сельсовет» реализуются следующие мероприятия, включенные в перечень муниципальной программы по формированию современной городской среды:

- благоустройство общественной территории «Сквер» с. Успенка;
- благоустройство дворовой территории дома №9 ул. Микрорайон, с. Успенка.

Согласно паспорту муниципальной программы, реализация мероприятий программы будет осуществляться в период 2018-2022 годы, ответственным исполнителем Программы является Администрация МО «Успенский сельсовет».

Целями муниципальной программы являются:

- повышение качества и комфорта среды на территории МО «Успенский сельсовет»;
- совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Успенский сельсовет»;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования;
- совершенствование эстетического вида;
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта.

Акт проверки №6 от 25.12.2019г.

Задачами муниципальной программы являются:

- формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» с учетом основных подходов территориального развития;
- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Успенский сельсовет»
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства МО «Успенский сельсовет»
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- * проведение ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования – 2 ед., из них:
 - проведение ремонтных работ по благоустройству дворовой территории – 1 ед.;
 - проведение ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха – 1 ед.;
- * приведение правил благоустройства МО «Успенский сельсовет» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- * представление в Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский район» проекта по благоустройству общественных территорий на 2018-2022 годы.

Адресные перечни дворовых территорий и мест массового отдыха населения (скверов) МО «Успенский сельсовет», подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, отражены в Приложениях №1, 2 к муниципальной программе.

Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия. Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Приложении №6 к программе. В 2018 году заинтересованные лица трудового участия при реализации муниципальной программы не принимали.

4. Анализ исполнения муниципальной программы

Согласно Решению Совета МО «Успенский сельсовет» «Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО «Успенский сельсовет» за 2018 год» от 29.04.2019г. №6 исполнение по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Успенский сельсовет» составило:

- КБК 400050305000L5550 - 1182,68491 тыс. руб.;
- КБК 400050305000B5550 - 212,88329 тыс. руб.

4.1. Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 год показал, что мероприятия муниципальной программы реализованы в поселении на 100%, планируемые результаты достигнуты на 100%. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 1 182,68491 тыс. руб., в том числе:

- муниципальный контракт №0125300004518000005-0147971-01 на выполнение работ по благоустройству прилегающей к многоквартирному жилому дому дворовой территории по адресу: Микрорайон, 9 «а», с.Успенка, Ахтубинский район, Астраханская область заключен 04.06.2018г. между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ООО «БАРС». Цена контракта 398,83764 тыс. рублей.

Акт проверки №6 от 25.12.2019г.

Согласно п.5.2 Муниципального контракта работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости.

После окончания работ подрядчиком предоставлены следующие документы:

* Акт №1 от 07.08.2018 года о приемке выполненных работ (форма КС-2) на общую сумму 398,83764 тыс. руб.;

* Справка №1 от 07.08.2018г. о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на общую сумму 398,83764 тыс. руб.

Работы по муниципальному контракту завершены 07.08.2018 года, с нарушением сроков.

- муниципальный контракт №0125300004518000004-0147971-01 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер» села Успенка по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с.Успенка, в районе Микрорайона заключен 04.06.2018г. между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ООО «БАРС». Цена контракта 398,309 тыс. рублей.

Согласно п.5.2 Муниципального контракта работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости.

После окончания работ подрядчиком предоставлены следующие документы:

* Акт №1 от 07.08.2018 года о приемке выполненных работ (форма КС-2) на общую сумму 398,309 тыс. руб.;

* Справка №1 от 07.08.2018г. о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на общую сумму 398,309 тыс. руб.

Работы по муниципальному контракту завершены 07.08.2018 года, с нарушением сроков.

Согласно объяснительной Главы МО «Успенский сельсовет» (исх. №783 от 24.12.2019г.) работы по Муниципальным контрактам №0125300004518000004-0147971-01 от 04.06.2018г., №0125300004518000005-0147971-01 от 04.06.2018г. выполнены с нарушением сроков по причине несвоевременности размещения схемы ремонтируемых участков по заключенным контрактам на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер с.Успенка» и прилегающей к многоквартирному жилому дому дворовой территории по ул. Микрорайон д.9а, а также неблагоприятными погодными условиями.

Согласно п.4.2 Муниципальных контрактов №0125300004518000005-0147971-01 от 04.06.2018г., 0125300004518000004-0147971-01 от 04.06.2018г. срок выполнения работ составляет 45 календарных дней с момента заключения контракта, т. е. не позднее 19.07.2018г. Дополнительных соглашений к Муниципальным контрактам, писем о продлении сроков контрактов к проверке не представлены.

Согласно п.9.1, 9.2 Муниципальных контрактов стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, делающей невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

Согласно п.8.3 Муниципальных контрактов в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и физически исполненных Подрядчиком.

Расчет размера пени приведен в Таблице №1:

Таблица №1

№ п/п	Сумма контракта, тыс. руб.	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Размер пени (гр.2*гр.3*1/300*гр.4/100), тыс. руб.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5
Муниципальный контракт №0125300004518000005-0147971-01 от 04.06.2018г.				
1	398,83764	19	7,25	1,83133
Муниципальный контракт №0125300004518000004-0147971-01 от 04.06.2018г.				
2	398,309	19	7,25	1,8289
Всего				3,66023

Претензионная работа Администрацией МО «Успенский сельсовет» по взысканию пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по Муниципальным контрактам №0125300004518000005-0147971-01 от 04.06.2018г., №0125300004518000004-0147971-01 от 04.06.2018г. не проведена. **Сумма неистребованной пени составила 3,66023 тыс. руб.**

- муниципальный контракт №437 от 29.06.2018г. заключен между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ИП Гавриловым П. Н. на поставку комплектующих к детскому игровому оборудованию (по спецификации: Башня с полом 3200x700 в количестве 3 шт на общую сумму 90,0 тыс. руб.; Лаз 1200x700 в количестве 1 шт на общую сумму 8,0 тыс. руб.). Цена контракта 98,0 тыс. рублей.

После поставки товара продавцом предоставлены следующие документы:

- * Товарная накладная №141 от 27.07.2018г. на общую сумму 98,0 тыс. руб.;
- * Счет-фактура №00141 от 27.07.2018г. на общую сумму 98,0 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта поставка товара производится в течение 30 дней со дня подписания контракта. Сроки поставки товара не нарушены.

- муниципальный контракт №438 от 29.06.2018г. заключен между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ИП Гавриловым П. Н. на поставку комплектующих к детскому игровому оборудованию (по спецификации: Переход 5600x40 в количестве 2 шт на общую сумму 18,0 тыс. руб.; Ограждение моста 2000 в количестве 4 шт на общую сумму 60,0 тыс. руб., Лиана 1000 в количестве 1 шт на общую сумму 10,0 тыс. руб., Спираль 1500 в количестве 1 шт на общую сумму 10,0 тыс. руб.). Цена контракта 98,0 тыс. рублей.

После поставки товара продавцом предоставлены следующие документы:

- * Товарная накладная №142 от 27.07.2018г. на общую сумму 98,0 тыс. руб.;
- * Счет-фактура №00142 от 27.07.2018г. на общую сумму 98,0 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта поставка товара производится в течение 30 дней со дня подписания контракта. Сроки поставки товара не нарушены.

- муниципальный контракт №439 от 29.06.2018г. заключен между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ИП Гавриловым П. Н. на поставку комплектующих к детскому игровому оборудованию (по спецификации: Горка 1000x600 в количестве 1 шт на общую сумму 20,0 тыс. руб.; Горка 1200x900 в количестве 1 шт на общую сумму 20,0 тыс. руб., Горка 1500x1200 в количестве 1 шт на общую сумму 20,0 тыс. руб., Лестница 1700x660 в количестве 1 шт на общую сумму 38,23827 тыс. руб.). Цена контракта 98,23827 тыс. рублей.

После поставки товара продавцом предоставлены следующие документы:

- * Товарная накладная №143 от 27.07.2018г. на общую сумму 98,23827 тыс. руб.;
- * Счет-фактура №00143 от 27.07.2018г. на общую сумму 98,23827 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта поставка товара производится в течение 30 дней со дня подписания контракта. Сроки поставки товара не нарушены.

- муниципальный контракт №440 от 29.06.2018г. заключен между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ИП Гавриловым П. Н. на поставку детского игрового оборудования (по спецификации: Карусель в количестве 1 шт на общую сумму 18,3 тыс. руб.; Воркаут в количестве 1 шт на общую сумму 72,0 тыс. руб.). Цена контракта 90,3 тыс. рублей.

После поставки товара продавцом предоставлены следующие документы:

* Товарная накладная №144 от 27.07.2018г. на общую сумму 90,3 тыс. руб.;

* Счет-фактура №00144 от 27.07.2018г. на общую сумму 90,3 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта поставка товара производится в течение 30 дней со дня подписания контракта. Сроки поставки товара не нарушены.

- муниципальный контракт №441 от 29.06.2018г. заключен между Администрацией МО «Успенский сельсовет» и ИП Гавриловым П. Н. на поставку малых архитектурных форм (по спецификации: Лавочка в количестве 2 шт на общую сумму 0,5 тыс. руб.; Урна в количестве 4 шт на общую сумму 0,5 тыс. руб.). Цена контракта 1,0 тыс. рублей.

После поставки товара продавцом предоставлены следующие документы:

* Товарная накладная №145 от 27.07.2018г. на общую сумму 1,0 тыс. руб.;

* Счет-фактура №00145 от 27.07.2018г. на общую сумму 1,0 тыс. руб.

В соответствии с условиями контракта поставка товара производится в течение 30 дней со дня подписания контракта. Сроки поставки товара не нарушены.

4.2. Паспортом Муниципальной программы предусмотрена реализация программных мероприятий, финансируемых за счет внебюджетных средств. Размер внебюджетных средств составляет не менее 2% от суммы субсидии на текущий год. В 2018 году размер внебюджетных средств составил 23,6537 тыс. руб., фактический объем внебюджетных средств составил 23,961 тыс. руб.

Заинтересованными лицами было приобретено и передано в собственность МО «Успенский сельсовет» на осуществление общепольных целей (благоустройство сквера с.Успенка) следующее имущество:

Таблица 2

№п/п	Имущество	Количество, шт	Сумма, тыс. руб.
Договор пожертвования №б/н от 04.09.2018г. (жертвователь Тажиев М. Б.)			
1	Сетка для футбольных ворот Soccer Goal Net белый р.0	2,0	1,598
2	Сетка волейбольная Cliff 8004/3000 черная, парафин 0,6 мм	1,0	1,235
3	Мяч футбольный Jogel England №5	1,0	0,831
4	Мяч волейбольный Torres Hit (v30055)	1,0	1,417
Итого		5,0	5,081
Договор пожертвования №б/н от 04.09.2018г. (жертвователь Гетманцева Н. В.)			
5	Скамья дачная	2,0	18,0
6	Мяч баскетбольный Meik №7	1,0	0,69
7	Сетка баскетбольная нить 2,5 мм, белая	2,0	0,19
Итого		5,0	18,88
Всего		10,0	23,961

5. Анализ кассового расходов на реализацию муниципальной программы

Работы по благоустройству общественной территории «Сквер с.Успенка» и прилегающей к многоквартирному жилому дому дворовой территории по адресу:

Акт проверки №6 от 25.12.2019г.

Микрорайон, 9 «а», с.Успенка, Ахтубинский район, Астраханская область завершены, оплата произведена в полном объеме. Нарушения сроков оплаты не выявлены.

Общая сумма оплаты по муниципальным контрактам составила 1 182,68491 тыс. руб. (Таблица 3):

Таблица 3

Муниципальный контракт	Подрядчик/поставщик	Сумма контракта	Счет на оплату		Платежное поручение	
			Дата, №	Сумма, тыс.руб.	Дата, №	Сумма, тыс.руб.
01253000045180000 04-0147971-01 от 04.06.2018г.	ООО «БАРС»	398,309	34 от 10.08.2018г.	398,309	128024 от 14.08.2018г.	398,309
01253000045180000 05-0147971-01 от 04.06.2018г.	ООО «БАРС»	398,83764	33 от 10.08.2018г.	398,83764	128516 от 14.08.2018г.	398,83764
437 от 29.06.2018г.	ИП Гаврилов П. Н.	98,0	141 от 27.07.2018г.	98,0	79963 от 03.08.2018г.	98,0
438 от 29.06.2018г.	ИП Гаврилов П. Н.	98,0	142 от 27.07.2018г.	98,0	78738 от 03.08.2018г.	98,0
439 от 29.06.2018г.	ИП Гаврилов П. Н.	98,23827	143 от 27.07.2018г.	98,23827	93567 от 07.08.2018г.	98,23827
440 от 29.06.2018г.	ИП Гаврилов П. Н.	90,3	144 от 27.07.2018г.	90,3	79965 от 03.08.2018г.	90,3
441 от 29.06.2018г.	ИП Гаврилов П. Н.	1,0	145 от 27.07.2018г.	1,0	80166 от 03.08.2018г.	1,0
Всего		1182,68491		1182,68491		1182,68491

В 2019 году иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджету МО «Успенский сельсовет» на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» на 2018-2022 год» не предоставлялись.

6. Проверка принятия к бухгалтерскому учету объектов благоустройства

Администрацией МО «Успенский сельсовет» к проверке представлены акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, согласно которым объекты по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха по результатам выполненных мероприятий по формированию комфортной городской среды приняты к бухгалтерскому учету в сумме 1206,64591 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных средств - 23,961 тыс. руб.

7. Визуальный осмотр объектов МО «Успенский сельсовет» показал:

Согласно Приложению №8 к Муниципальной программе Администрацией МО «Успенский сельсовет» утвержден Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории МО «Успенский сельсовет», а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории МО «Успенский сельсовет». В соответствие с указанным Порядком были утверждены дизайн-проекты благоустройства территории общего пользования, а также благоустройства дворовой территории:


- Постановление Администрации МО «Успенский сельсовет» №7-а от 24.01.2018г. «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в муниципальную программу МО «Успенский сельсовет» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.»;

- Постановление Администрации МО «Успенский сельсовет» №8 от 31.01.2018г. «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в

муниципальную программу МО «Успенский сельсовет» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг».

В целях оценки фактического состояния выполненных подрядными организациями работ по благоустройству дворовой территории и территории общего пользования был осуществлен выезд на места расположения благоустроенных территорий в МО «Успенский сельсовет». При проведении визуального осмотра установлено:

- 1) Фактически выполненные работы по благоустройству дворовой территории соответствуют утвержденному дизайн-проекту;
- 2) Фактическое расположение объектов благоустройства общественной территории **не соответствует** утвержденному дизайн-проекту:

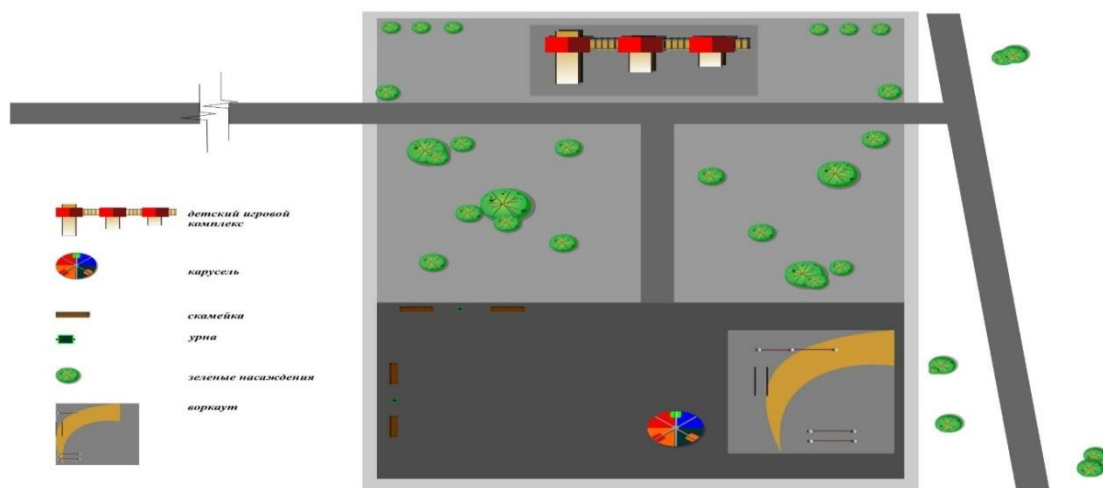

Из полученных объяснений главы МО «Успенский сельсовет» следует, что объект благоустройства «Карусель» перенесена с территории сквера с. Успенка на детскую площадку между домов 7 и 8 по улице Микрорайон в целях сохранности аттракциона ввиду недобросовестности и халатности проживающих рядом со сквером жильцов. Объяснительная исх.№784 от 24.12.2019г. прилагается.

Выводы по результатам проверки:

- 1) Объем проверенных средств составляет 1419,5292 тыс. руб.;
 - 2) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенского сельсовета» на 2018-2022гг.» утверждена Постановлением администрации «Успенского сельсовета» №82 от 21.12.2017г.;
 - 3) Решением Совета МО «Ахтубинский район «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 14.12.2017г. №396 (с изменениями) утверждено:
 - распределение иных межбюджетных трансфертам бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе бюджету МО «Успенский сельсовет» в размере 1 182,68491 тыс. руб.;
 - распределение иных межбюджетных трансфертам бюджетам поселений на обеспечение выполнения условий порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017г. №276 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в том числе бюджету МО «Успенский сельсовет» в размере 212,88329 тыс. руб.;
 - 4) Показатели объема финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы соответствуют объему расходов на финансирование муниципальной
- Акт проверки №6 от 25.12.2019г.

программы, утвержденному Решением Совета от 21.12.2017г. №28 «О бюджете МО «Успенский сельсовет» на 2018 год» (с изменениями).

5) В 2018 году на территории МО «Успенский сельсовет» реализуются следующие мероприятия, включенные в перечень муниципальной программы по формированию современной городской среды:

- благоустройство общественной территории «Сквер» с. Успенка;
- благоустройство дворовой территории дома №9 ул. Микрорайон, с. Успенка.;

6) В 2018 году заинтересованные лица трудового участия при реализации муниципальной программы не принимали.

7) Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 год показал, что мероприятия муниципальной программы реализованы в поселении на 100%, планируемые результаты достигнуты на 100%.

8) Работы по муниципальным контрактам №0125300004518000004-0147971-01 от 04.06.2018г., №0125300004518000005-0147971-01 от 04.06.2018г. выполнены с нарушением сроков. Претензионная работа Администрацией МО «Успенский сельсовет» по взысканию пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств не проведена. Сумма неистребованной пени составила 3,66023 тыс. руб.

9) Заинтересованными лицами было приобретено и передано в собственность МО «Успенский сельсовет» на осуществление общепользовных целей (благоустройство сквера с.Успенка) имущество на общую сумму 23,961 тыс. руб.

10) Работы по благоустройству общественной территории «Сквер с.Успенка» и прилегающей к многоквартирному жилому дому дворовой территории по адресу: Микрорайон, 9 «а», с.Успенка, Ахтубинский район, Астраханская область завершены, оплата произведена в полном объеме. Нарушения сроков оплаты не выявлены.

11) При проведении визуального осмотра установлено:
- фактически выполненные работы по благоустройству дворовой территории соответствуют утвержденному дизайн-проекту;
- фактическое расположение объектов благоустройства общественной территории не соответствует утвержденному дизайн-проекту.

12) В 2019 году иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджету МО «Успенский сельсовет» на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории МО «Успенский сельсовет» на 2018-2022 год» не предоставлялись.

Рекомендовать Администрации МО «Успенский сельсовет»:

1. Не допускать нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов путем заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам.
2. При нарушении сроков исполнения муниципальных контрактов поставщиками и подрядчиками проводить претензионную работу, производить расчет пени за каждый день просрочки.
3. Строго придерживаться дизайн-проекта при проведении работ по благоустройству и размещении объектов благоустройства.

Ведущий инспектор
Контрольно-счетной палаты
МО «Ахтубинский район»

Глава МО «Успенский сельсовет»

_____ Ю. В. Украинская
М.П.

_____ Мершиева О. В.
М.П.

Главный бухгалтер МО «Успенский
сельсовет»

_____ Москальцова Л. В.

Второй экземпляр акта получил _____

Акт отпечатан в двух экземплярах:

1 (один) экземпляр для МО «Успенский сельсовет»

1 (один) экземпляр для Контрольно-счетной палаты МО «Ахтубинский район»
