

**КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»**

Волгоградская ул., д.141, г. Ахтубинск, Астраханская область, 416500 Тел./факс (8-85141) 4-04-24 /, (8-85141) 4-04-15
ОКПО 78317643, ОГРН 1063022000282, ИНН/КПП 3001040259/300101001

АКТ № 11

**по результатам проведения контрольного мероприятия по теме:
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета,
выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» за 2018-2019гг.**

г. Ахтубинск

25 декабря 2019 г.

На основании п.4.10 Плана работы на 2019 год, распоряжения от 02.12.2019 г. №20-р мною, ведущим инспектором Контрольно-счетной палаты МО «Ахтубинский район» Аржановой Ириной Николаевной в отношении муниципального образования «Село Болхуны» (далее по тексту – МО «Село Болхуны»).

Цель мероприятия: определение законности и результативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018-2019гг.

Юридический адрес: 416523, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина 13.

Руководитель: Глава администрации муниципального образования «Село Болхуны» Руденко Николай Дмитриевич.

Проверяемый период деятельности: 2018 год, истекший период 2019 г.

Срок проведения проверки: с 05.12.2019 г. по 25.12.2019 г.

Метод проверки: выездная проверка.

Уведомление от 02.12.2019 №187 главе администрации МО «Село Болхуны».

К проверке были представлены следующие документы:

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- Постановление администрации МО «Село Болхуны» от 10.05.2017 №39-П «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Болхуны» на 2017 год и создании общественной комиссии для организации общественного обсуждения

Акт проверки №4 от 18.06.2019

проекта МП «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Болхуны» на 2017 год и рассмотрения предложений заинтересованных лиц;

- Постановление администрации МО «Село Болхуны» от 28.11.2017 №85-ПП «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.» (*далее по тексту муниципальная программа*);

- Постановление администрации МО «Село Болхуны» от 25.01.2019 №3 «О внесении изменений в постановление от 28.11.2017 №85-ПП «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.»;

- Постановление администрации МО «Село Болхуны» от 23.12.2017 №89 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в муниципальную программу МО «Село Болхуны» Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.»;

- Решение Совета МО «Село Болхуны» от 27.12.2018 №31 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Село Болхуны» от 11.12.2017 №30 «О бюджете МО «Село Болхуны» на 2018 год»;

- Решение Совета МО «Село Болхуны» от 27.12.2018 №13 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Село Болхуны» от 30.11.2018 №30 «О бюджете МО «Село Болхуны» на 2019 год»;

- Соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 №122/18;

- Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 №122/18;

- Соглашение о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Болхуны» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №64/19;

- Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Болхуны» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 №64/19» от 02.08.2019 №103/19.

В ходе проверки установлено следующее:

В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией МО «Село Болхуны» разработана *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» на период 2018-2022 гг.»* и утверждена постановлением администрации МО «Село Болхуны» от 28.11.2017 г. № 85-ПП (с изменениями от 25.01.2019г. №3).

Согласно паспорту Программы, ответственным исполнителем Программы является Администрация МО «Село Болхуны».

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2018-2022гг.

С учетом последующих изменений и дополнений Целью Программы является:

- совершенствование системы комплексного благоустройства села Болхуны;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания села Болхуны;

- активация работ по: благоустройству территории поселения в границах населенного пункта.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории села Болхуны;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства села Болхуны;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Проведение ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования-1ед., из них:

- проведение ремонтных работ по благоустройству парка Дома Культуры-1ед.;
- приведение правил благоустройства МО «Село Болхуны» в соответствие с Методическими рекомендациями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- представление в Управление коммунального хозяйства МО «Ахтубинский район» реализованный в 2018-2022 годах проект по благоустройству общественных территорий.

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения. А также, создание условий для работы и отдыха села Болхуны, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение улучшения внешнего вида территории села Болхуны, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы всего составляет **1277,76443** тыс. руб. в т.ч.:

- за счет средств *субсидий из федерального бюджета* - **1125,99777** тыс. руб.;
- за счет средств *субсидий из бюджета Астраханской области* - **63,07842** тыс. руб.;
- *компенсация расходов бюджета Астраханской области*, предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны» - **49,12691** тыс. руб.;
- *компенсация расходов бюджета МО «Ахтубинский район»*, предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны» - **13,95151** тыс. руб.;
- за счет *средств местного бюджета* МО «Село Болхуны» - **25,60982** тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

Объем финансирования в 2018 году составляет **347,66402** тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств *субсидий из федерального бюджета* – **223,80038** тыс. руб.;
- за счет средств *субсидий из бюджета Астраханской области* – **49,12691** тыс. руб.;
- *компенсация расходов бюджета Астраханской области*, предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны» - **49,12691** тыс. руб.;
- *компенсация расходов бюджета МО «Ахтубинский район»*, предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны» - **25,60982** тыс. руб.

Объем финансирования в 2019 году составляет **930,10041** тыс. руб. в т.ч.:

- за счет средств *субсидий из федерального бюджета* – **902,19739** тыс. руб.;
- за счет средств *субсидий из бюджета Астраханской области* – **13,95151** тыс. руб.;

- компенсация расходов бюджета МО «Ахтубинский район», предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны» - 13,95151 тыс. руб.

Администрацией МО «Село Болхуны» в паспорт муниципальной программы (с изменениями от 25.01.2019 №3) не внесена компенсация расходов бюджета МО «Село Болхуны» в сумме 13,95151 тыс. руб.

При проверке соответствия объемов финансирования предусмотренных в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны», бюджетным ассигнованиям утвержденным Решением Совета о бюджете на 2018 год установлено следующее:

Решением Совета МО «Ахтубинский район «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год» (в редакции от 28.12.2017 № 405, от 15.02.2018 № 415, от 29.03.2018 № 435, от 15.05.2018 № 441, от 01.06.2018 № 452, от 13.06.2018 № 455, от 19.07.2018 № 464, от 20.09.2018 № 476, от 13.12.2018 № 507, от 27.12.2018 №508) (далее - Решение Совета о бюджете на 2018 год) включено распределение иных межбюджетных трансфертам бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды за 2018 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Село Болхуны» в размере **272,92729** тыс. руб.

Согласно Решению Совета МО «Село Болхуны» «О бюджете муниципального образования «Село Болхуны» на 2018 год от 27.12.2018 №31, утвержденные назначения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» по разделу 05 00 составили **347,66402** тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета составили 272,92729 тыс. руб., за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области (компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны») 49,12691 тыс. руб., из бюджета МО «Село Болхуны» - 25,60982 тыс. руб.

Расхождения объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» с объемами, предусмотренными Решением Совета о бюджете на 2018 год не установлены.

Решением Совета МО «Ахтубинский район» от 13.12.2018 № 505 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в ред. от 28.02.2019 №525, от 30.04.2019 №545, от 11.07.2019 №565) (далее – Решение Совета о бюджете на 2019 год) включено распределение иных межбюджетных трансфертам бюджетам поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год, предусматривающее выделение средств бюджету муниципального образования «Село Болхуны» в размере **930,10041** тыс. руб.

Согласно Решению Совета МО «Село Болхуны» «О бюджете муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год от 26.09.2019 №13, утвержденные назначения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» по разделу 05 00 составили **944,05192** тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета - 930,10041 тыс. руб., компенсация расходов - 13,95151 тыс. руб.

Расхождения объемов финансирования основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» с объемами, предусмотренными Решением о бюджете на 2019 год не установлены.

Анализ договоров, заключенных Администрацией МО «Село Болхуны» с подрядчиками на выполнение работ (оказание услуг) в 2018 - 2019 гг.

Администрацией МО «Село Болхуны» на выполнение работ и оказание услуг в рамках исполнения Программы

в 2018 году заключены:

1) Соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 № 122/18 муниципальному образованию «Село Болхуны» на сумму 272,92729 тыс. руб. (далее - Соглашение от 20.06.2018 № 122/18);

Согласно п. 4.3.7.4. Соглашения от 20.06.2018 №122/18 муниципальное образование «Село Болхуны» обязуется:

- обеспечивать перечисление в бюджет муниципального образования из бюджета получателя денежных средств в размере 49,12691 тыс. руб., на компенсацию расходов бюджета муниципального образования, предоставляемых на реализацию мероприятий, указанных в п.1 Порядка и определенных в соответствии с подпунктом 7.3. пункта 7 Порядка. Перечисление денежных средств на компенсацию расходов муниципального образования осуществляется в течении 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего финансового года.

2) Дополнительное соглашение от 25.07.2018 № 137/18 к Соглашению о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 № 122/18.

Четыре договора подряда на общую сумму 298,53711тыс. руб., из них 25,60982 тыс. руб., за счет собственных средств, в том числе:

- договор подряда от 20.04.2018 № 3 с ИП Леонов О.Ю. на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 88,69153тыс. руб.;

- договор подряда от 20.04.2018 №33/эск с ООО «Элкостройкомплект» на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 92,11788 тыс. руб.;

- договор подряда от 14.05.2018 №37/эск с ООО «Элкостройкомплект» на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 92,11788 тыс. руб.;

- договор подряда от 14.05.2018 №4 с ИП Леонов О.Ю. на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 25,60982 тыс. руб.

в 2019 году заключены:

1) Соглашение о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Болхуны» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» городской программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 № 64/19 на сумму 930,10041 руб. (далее - Соглашение от 23.05.2019 № 64/19);

2) Дополнительное соглашение от 02.08.2019 № 103/19 к Соглашению от 23.05.2019 № 64/19;

Согласно подпункта 4.3.1.1. Соглашения от 23.05.2019 получатель обеспечивает перечисление в бюджет МО «Ахтубинский район» в течении текущего финансового года в

сроки, необходимые для исполнения расходного обязательства МО «Село Болхуны» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, но не позднее 1 декабря текущего финансового года, денежных средств в размере 13,95151 тыс. руб.

Один муниципальный контракт и три договора подряда на общую сумму 930,10041 рублей:

- муниципальный контракт от 24.06.2019 №01253000040190000010001 с ООО «ГРАНО» благоустройство сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 697,57650 тыс. руб.; Дополнительное соглашение к муниципальному контракту №01253000040190000010001 от 06.08.2019;

- договор подряда от 26.06.2019 №14 с ООО «ГРАНО» на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 74,80000 тыс. руб.;

- договор подряда от 26.06.2019 №13 с ООО «ГРАНО» на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 85,20000 тыс. руб.;

- договор подряда от 26.06.2019 №12 с ООО «ГРАНО» на выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» на сумму 72,52391 тыс. руб.

Анализ кассовых расходов, произведенных за счет всех источников финансирования в разрезе мероприятий программы, объектов:

Согласно вышеуказанных договоров подряда, подрядчиками в 2018 году являлись ООО «Элкостройкомплект» и ИП Леонов О.Ю., в 2019 году ООО «ГРАНО». В соответствии с данными договорами, предметами договоров является выполнение работ по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина 12.

Информация о кассовых расходах представлена в таблице № 1

(тыс.руб.)

Основание оплаты	Сумма	Номер, дата и сумма платежного документа
1	2	3
2018 год		
ООО «Элкостройкомплект» договор подряда №33/эск от 20.04.2018 Счет № ЦБ-157 от 16.05.2018 Счет №225 от 23.05.2018 (Акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.05.2018)	27,63536 64,48252 92,11788	№ 58956 от 01.08.2018 на сумму 27,63536 тыс. руб. № 80165 от 03.08.2018 на сумму 64,48252 тыс. руб.
ИП Леонов О.Ю., договор подряда №3 от 20.04.2018 Счет №3 от 16.05.2018 Счет №11 от 23.05.2018 (Акт о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2018)	26,60745 62,08408 88,69153	№57863 от 01.08.2018 на сумму 26,60745 тыс. руб. №80161 от 03.08.2018 на сумму 62,08408 тыс. руб.
ИП Леонов О.Ю., договор подряда №4 от 14.05.2018 Счет №4 от 16.05.2018 Счет №5 от 23.05.2018 (Акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.05.2018)	7,68294 17,92688 25,60982	№ 542469 от 18.05.2018 на сумму 7,68294 тыс. руб. № 572135 от 25.05.2018 на сумму 17,92688 тыс. руб.
ООО «Элкостройкомплект» договор подряда №37/эск от 14.05.2018 Счет №ЦБ-159 от 16.05.2018 Счет №ЦБ-226 от 23.05.2018 (Акт о приемке выполненных работ №1 от	27,63536 64,48252 92,11788	№ 58957 от 01.08.2018 на сумму 27,63536 тыс. руб. №80163 от 03.08.2018 на сумму 64,48252 тыс. руб.

23.05.2018)		
ИТОГО:	298,53711	
2019 год ООО «ГРАНО» муниципальный контракт №01253000040190000010001 от 24.06.2019 Счет №20 от 17.07.2019 (Акт о приемке выполненных работ №1 от 24.07.2019)	697,57650 697,57650	№439283 от 09.08.2019 на сумму 697,57650 тыс. руб
ООО «ГРАНО» договор подряда №14 от 26.06.2019 Счет №8 от 12.07.2019 Счет фактура №10 от 25.07.2019, акт №10 от 25.07.2019	22,44000 74,80000	№439770 от 09.08.2019 на сумму 22,44000 тыс. руб. №454927 от 13.08.2019 на сумму 52,36000 тыс. руб.
ООО «ГРАНО» договор подряда №13 от 26.06.2019 Счет №9 от 12.07.2019 Счет-фактура №11 от 25.07.19, Акт №11 от 25.07.2019	25,56000 85,20000	№437652 от 09.08.2019 на сумму 25,56000 тыс. руб. №454928 от 13.08.2019 на сумму 59,64000 тыс. руб.
ООО «ГРАНО» договор подряда №12 от 26.06.2019 Счет №7 от 12.06.2019 Счет-фактура №9 от 25.07.2019, Акт №9 от 25.07.2019	21,75717 72,52391	№439771 от 09.08.2019 на сумму 21,75717 тыс. руб. №454926 от 13.08.2019 на сумму 50,76674 тыс. руб.
ИТОГО:	930,10041	
ВСЕГО	1228,63752	

Кассовый расход по договорам подряда за 2018 год сложился в размере 298,53711 тыс. руб., из них: 272,92729 тыс. руб., за счет средств субсидий из федерального бюджета и 25,60982 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, что соответствует сумме, указанной в Соглашении от 20.06.2018 № 122/18.

За 2019 год кассовый расход по договорам подряда и муниципальному контракту сложился в размере 930,10041 тыс. руб., что соответствует сумме, указанной в Соглашении от 23.05.2019 № 64/19.

Таким образом, выделенные средства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 в сумме 298,53711 тыс. руб., и в 2019 в сумме 930,10041 тыс. руб., были использованы в полном объеме.

В силу п.3.4. договоров подряда (№33/эск от 20.04.2018, №37/эск от 14.05.2018) с ООО «Элкостройкомплект» и договоров подряда (№12,13,14 от 26.06.2019) с ООО «ГРАНО» «заказчик» в течении 7 рабочих дней проверяет и акцептует представленные «подрядчиком» счета за выполненные работы. Оплата производится с предъявлением приемки выполненных работ по объекту в течении 7 календарных дней со дня подписания акта. Взаиморасчеты осуществлять по методике, разработанной Астраханским региональным центром. Возмещение стоимости материалов производить по расчетам подрядчика, подтвержденными документами.

В силу п. 3.3. договора подряда №3 от 20.04.2018 с ИП Леоновым О.Ю., «заказчик» в течении 7 рабочих дней проверяет и акцептует представленные «подрядчиком» счета за выполненные работы. Оплата производится с предъявлением приемки выполненных работ по объекту в течении 5 календарных дней со дня подписания акта. Взаиморасчеты осуществлять по методике, разработанной Астраханским региональным центром. Возмещение стоимости материалов производить по расчетам подрядчика, подтвержденными документами.

Из выше приведенной таблицы видно, что оплата за выполненные работы «заказчиком», в 2018 году была произведена без нарушения сроков, с ИП Леоновым О.Ю. (договор подряда №4 от 14.05.2018) и ООО «ГРАНО» (муниципальный контракт №01253000040190000010001 от 24.06.2019). По всем остальным договорам подряда за 2018 и 2019гг., «заказчиком» были нарушены сроки оплаты за выполненные работы по объекту: «Благоустройство сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина 12, а именно:

- по договору подряда №33/эск от 20.04.2018 с ООО «Элкостройкомплект», акт о приемке выполненных работ №1 был подписан 23.05.2018, тем самым оплату необходимо было перечислить согласно п. 3.3. договора подряда, не позднее 30.05.2018;

- по договору подряда №3 от 20.04.2018 с ИП Леоновым О.Ю., акт о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2018, тем самым оплату необходимо было перечислить согласно п. 3.3. договора подряда, не позднее 28.05.2018;

- по договору подряда №37/эск от 14.05.2018 с ООО «Элкостройкомплект», акт о приемке выполненных работ №1 от 23.05.2018, тем самым оплату необходимо было перечислить согласно п. 3.3. договора подряда, не позднее 30.05.2018;

- по договору подряда №12 от 26.06.2019 с ООО «ГРАНО», акт о приемке выполненных работ №9 от 25.07.2019, тем самым оплату необходимо было перечислить согласно п. 3.4. договора подряда, не позднее 01.08.2019;

- по договору подряда №13 от 26.06.2019 с ООО «ГРАНО», акт о приемке выполненных работ №11 от 25.07.2019, тем самым оплату необходимо было перечислить согласно п. 3.4. договора подряда, не позднее 01.08.2019;

- по договору подряда №14 от 26.06.2019 с ООО «ГРАНО», акт о приемке выполненных работ №10 от 25.07.2019, тем самым оплату необходимо было перечислить согласно п. 3.4. договора подряда, не позднее 01.08.2019.

Администрацией МО «Село Болхуны» были предоставлены реестры перечисленных поступлений (иной межбюджетный трансферт) Управления Федерального казначейства по Астраханской области в бюджет МО «Село Болхуны» от 31.07.2018 №919998 в сумме 272,92729 тыс. руб., от 07.08.2019 №1042063 в сумме 930,11467 тыс. руб. По данным реестрам видно, что перечисление иного межбюджетного трансферта было произведено в 2018 году 31.07.2018, в 2019 году 07.08.2019. Исходя из этого, администрации МО «Село Болхуны», произвести оплату «подрядчику» в срок по вышеуказанным договорам подряда в 2018 и 2019гг., не предоставлялось возможным.

Работы по объекту благоустройства сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» выполнены в полном объеме.

Проверка соблюдения условий софинансирования при предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий программы.

Проверкой соблюдения условий софинансирования при предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджету МО «Село Болхуны» на реализацию мероприятий Программы нарушений не установлено.

Согласно пункту 2.1. Соглашения от 23.05.2019 № 64/19 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Село Болхуны» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в 2019 год составляет 930,10041 тыс. рублей.


Пунктом 2.2. Соглашения от 23.05.2019 № 64/19 предусмотрено, что размер иного межбюджетного трансферта, направленного на достижение результатов регионального проекта в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 98,5% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего соглашения, но не более 916,14800 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Село Болхуны» на финансовое обеспечение расходных обязательств за счет всех источников финансирования в 2019 году, составил 930,10041 руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 902,19739 тыс. руб. (97,0%),
- из регионального бюджета – 13,95151 тыс. руб. (1,5%),
- из районного бюджета – 13,95151 тыс. руб. (1,5%).

Визуальный осмотр объектов Администрации МО «Село Болхуны» показал:

В ходе визуального осмотра установлено, что проведены работы по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» (Фото №1, Фото №2)

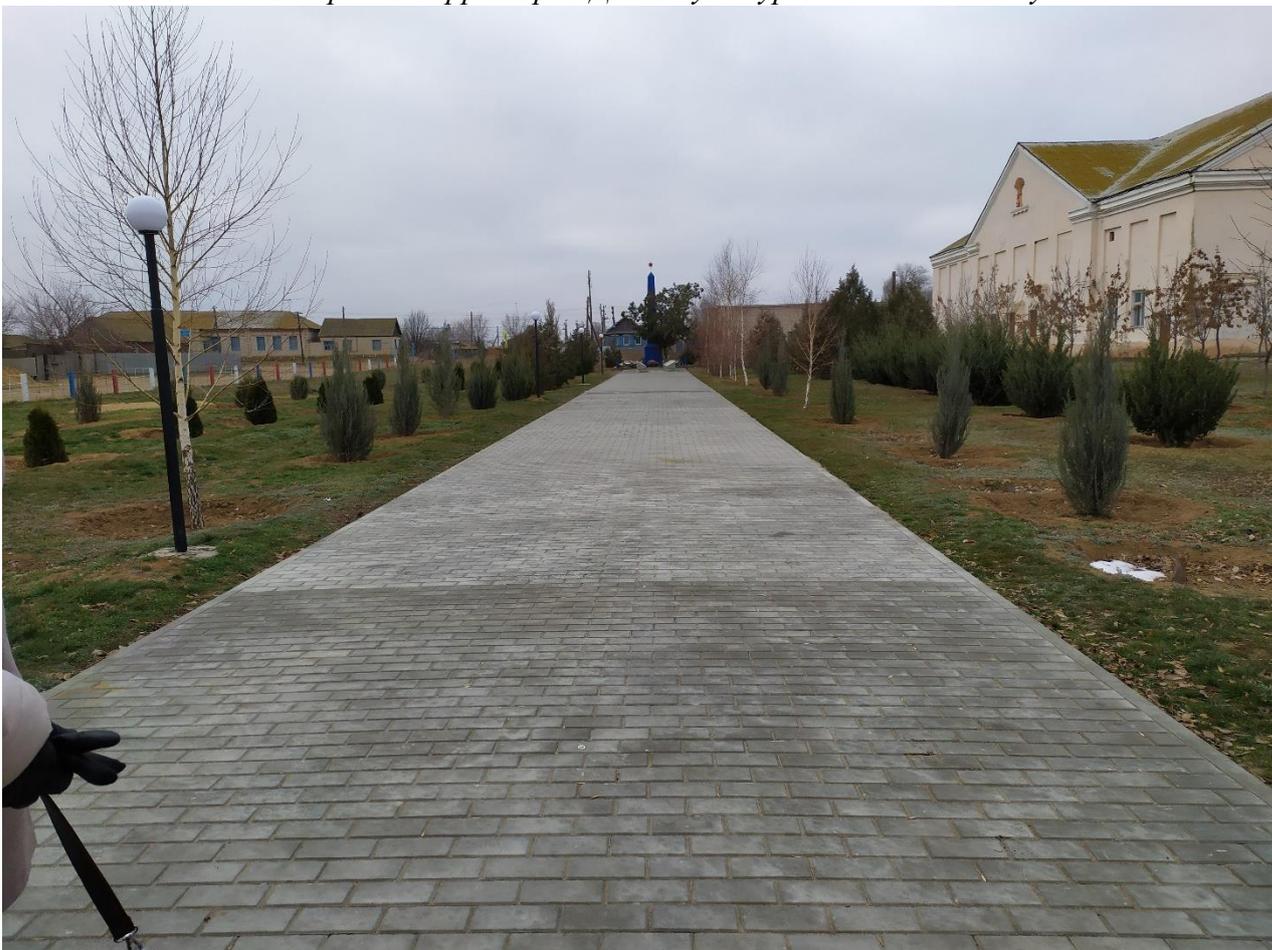

Вывод: работы в 2018-2019 гг. по благоустройству сквера на территории МКУК «Дом культуры» МО «Село Болхуны» по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина 12, выполнены в полном объеме.

Администрацией МО «Село Болхуны» к проверке представлены карточки счетов, согласно которым объекты по благоустройству территорий в ходе выполнения мероприятий по формированию комфортной городской среды приняты к бухгалтерскому учету, а именно:

- на забалансовый счет 21.34 «Основные средства в эксплуатации» в сумме 80,42023 тыс. руб., поставлены на учет светильники, уличные диваны;
- на счет 105.36 «Материальные запасы» в сумме 73,20000 тыс. руб., поставлены на учет многолетние насаждения (можжевельник, ель);
- на счет 101.12 «Основные средства» в сумме 1132,52152 тыс. руб., поставлен на учет Сквер на территории Дома культуры.

Проверка реализации мероприятий по организации общественного участия в реализации мероприятий по Формированию современной городской среды: утверждение и общественное обсуждение Муниципальной программы, соблюдение порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования

1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» проводилось в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Болхуны» на 2017 год и создании общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Болхуны» на 2017 год и рассмотрения заинтересованных лиц от 10.05.2017 №39-П.

Согласно Протокола «Заседания общественной комиссии по развитию городской среды на территории МО «Село Болхуны»» от 16.10.2017 №2, общественная комиссия рекомендовала администрации МО «Село Болхуны» разместить на официальном сайте администрации ПРОЕКТ муниципальной программы.

После чего, согласно Протокола «заседания общественной комиссии» от 20.11.2017 №3, общественная комиссия рекомендовала утвердить муниципальную программу.

В связи с чем, была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг», *в ходе проверки нарушения не обнаружены.*

2. В силу п. 7 Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования МО «Село Болхуны» Приложения №6 муниципальной программы, разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования, осуществляется работниками администрации МО «Село Болхуны» в отношении общественных территорий – 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы.

В соответствии п.11 в целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, администрация МО «Село Болхуны» в течении 1 рабочего дня со дня подготовки дизайн-проекта благоустройства общественной территории размещает его на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны» в сети Интернет.

Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования был размещен на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны» <https://bolhuny-adm.ru/>, *отследить сроки размещения дизайн-проекта не предоставляется возможным.*

На основании п.12. Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования МО «Село Болхуны», обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, осуществляется с участием населения села Болхуны путем голосования. Голосование проводится в течении 10 дней путем выбора одного из представленных дизайн-проектов. Результаты голосования оформляются в протоколе заседания Общественной комиссии.

После чего, протокол заседания общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта подлежит размещению на официальном сайте в течении трех дней со дня его подписания. *Отследить сроки размещения данного протокола, не предоставляется возможным.*

В силу п. 15 Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования МО «Село Болхуны», утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется администрацией МО «Село Болхуны» в течении 2 рабочих дней со дня получения протокола Общественной комиссии о согласовании дизайн- проекта благоустройства общественной территории. *Сроки согласования дизайн-проекта не нарушены.*

Выводы:

Объем проверенных средств составляет 1291,71594 тыс. руб.

1. В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией МО «Село Болхуны» разработана *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» на период 2018-2022 гг.»* и утверждена постановлением администрации МО «Село Болхуны» от 28.11.2017 г. № 85-ПП (с изменениями от 25.01.2019г. №3).

2. Администрацией МО «Село Болхуны» в паспорт муниципальной программы (с изменениями от 25.01.2019 №3) не внесена компенсация расходов бюджета МО «Село Болхуны» в сумме 13,95151 тыс. руб.

3. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения. А также, создание условий для работы и отдыха села Болхуны, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение улучшение внешнего вида территории села Болхуны, способствующего комфортной жизнедеятельности.

4. Согласно Решению Совета МО «Село Болхуны» «О бюджете муниципального образования «Село Болхуны» на 2018 год от 27.12.2018 №31, утвержденные назначения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» по разделу 05 00 составили 347,66402 тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета составили 272,92729 тыс. руб., за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области (компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий за счет средств бюджета МО «Село Болхуны») 49,12691 тыс. руб., из бюджета МО «Село Болхуны» - 25,60982 тыс. руб.

5. Расхождения объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» с объемами, предусмотренными Решением Совета о бюджете на 2018 год не установлены.

6. Соглашение о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды от 20.06.2018 № 122/18 муниципальному образованию «Село Болхуны» на сумму 272,92729 тыс. руб., а также обеспечивать перечисление в бюджет муниципального образования из бюджета получателя денежных средств в размере 49,12691 тыс. руб., на компенсацию расходов бюджета муниципального образования, предоставляемых на реализацию мероприятий, указанных в п.1 Порядка и определенных в соответствии с подпунктом 7.3. пункта 7 Порядка (далее - Соглашение от 20.06.2018 № 122/18).

7. Администрацией МО «Село Болхуны» заключены четыре договора подряда на общую сумму 298,53711 тыс. руб., из них 25,60982 тыс. руб., за счет собственных средств.

8. Кассовый расход по договорам подряда за 2018 год сложился в размере 298,53711 тыс. рублей, из них: 272,92729 тыс. руб., за счет средств субсидий из федерального

бюджета и 25,60982 тыс. руб., за счет средств местного бюджета что соответствует сумме, указанной в Соглашении от 20.06.2018 № 122/18.

9. Согласно Решению Совета МО «Село Болхуны» «О бюджете муниципального образования «Село Болхуны» на 2019 год от 26.09.2019 №13, утвержденные назначения муниципальной программе «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» по разделу 05 00 составили 944,05192 тыс. руб., в том числе средства из федерального бюджета - 930,10041 тыс. руб., компенсация расходов - 13,95151 тыс. руб.

10. Расхождения объемов финансирования основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды в МО «Село Болхуны» с объемами, предусмотренными Решением о бюджете на 2019 год не установлены.

11. Соглашение о предоставлении в 2019 году иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному образованию «Село Болхуны» на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» городской программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 23.05.2019 № 64/19 на сумму 930,10041 руб. (далее - Соглашение от 23.05.2019 № 64/19), а также обеспечивает перечисление в бюджет МО «Ахтубинский район» в течении текущего финансового года в сроки, необходимые для исполнения расходного обязательства МО «Село Болхуны» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды денежных средств в размере 13,95151 тыс. руб.

12. Администрацией МО «Село Болхуны» заключены: один муниципальный контракт и три договора подряда на общую сумму 930,10041 рублей.

13. Кассовый расход за 2019 год по договорам подряда и муниципальному контракту сложился в размере 930,10041 тыс. руб., что соответствует сумме, указанной в Соглашении от 23.05.2019 № 64/19.

14. Использование средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018 и 2019 гг., оценено как эффективное.

15. Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования был размещен на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны» <https://bolhuny-adm.ru/>, отследить сроки размещения дизайн-проекта не предоставляется возможным.

16. Протокол заседания общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта подлежит размещению на официальном сайте в течении трех дней со дня его подписания. *Отследить сроки размещения данного протокола, не предоставляется возможным.*

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Администрации МО «Село Болхуны»:

1. рассмотреть материалы проверки, учесть замечания и недостатки, выявленные в ходе проверки.

2. внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» в части добавления компенсации расходов бюджета МО «Село Болхуны» в сумме 13,95151 тыс. руб.

Ведущий инспектор
Контрольно-счетной палаты
МО «Ахтубинский район»

_____ И.Н. Аржанова
М.П.

Глава Администрации МО «Село
Болхуны»

_____ Руденко Н.Д.

М.П.

Главный бухгалтер Администрации МО
«Село Болхуны»

_____Цикова Ж.М.
